

Nr.		Vorgar	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mai 2021 26290205081					
1			Ausgabe Modularbeit	0 Tage	30.04.2021	30.04.2021		◆ 30.04 ◆ 02.05					
2			Start Modularbeit	0 Tage	02.05.2021	02.05.2021							
3			Abgabe Modularbeit	0 Tage	27.06.2021	27.06.2021							
4													
5			Modularbeit	34 Tage?	12.05.2021	26.06.2021							
6			Grundlagen Erarbeiten	0.5 Tage	12.05.2021	12.05.2021							
7			Dokument Übersicht erstellen	0.5 Tage	12.05.2021	12.05.2021	6						
8			Einrichten Plattform	0.5 Tage	13.05.2021	13.05.2021	7						
9			Bearbeiten der Dokumente	1 Tag?	25.06.2021	25.06.2021	8						
10			Abgabe	1 Tag?	26.06.2021	26.06.2021	33						
11													
12			Projekt X	42 Tage?	03.05.2021	28.06.2021							
13			Architekturmodell	0.25 Tage	18.06.2021	18.06.2021							
14			Tragwerksmodell	1 Tag	18.06.2021	18.06.2021							
15			Tragwerksmodell erstellen	1 Tag	18.06.2021	18.06.2021							
16			Tragwerksmodell	0 Tage	18.06.2021	18.06.2021	15						
17			Variantenvergleich	1 Tag	19.06.2021	21.06.2021							
18			Kostenmodell 1 aus Architekturmodell	1 Tag	19.06.2021	21.06.2021	13						
19			Kostenmodell 1	0 Tage	21.06.2021	21.06.2021	18						
20			Kostenmodell 2 aus Architekturmodell	1 Tag	19.06.2021	21.06.2021	13						
21			Kostenmodell 2	0 Tage	21.06.2021	21.06.2021	20						
22			Bauablaufsimulation	1 Tag	25.06.2021	25.06.2021							
23			Modellbasierte Bauablaufsimulation	1 Tag	25.06.2021	25.06.2021	19;21						


Projekt: msproj11
Datum: 27.06.2021

Vorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Vorgang		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Manueller Fortschritt	
Externe Vorgänge		Manueller Sammelrollup			
Externer Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			

Nr.		Vorgar	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mai 2021					
								26	29	02	05	08	1
24			Mengenermittlung	1 Tag	22.06.2021	22.06.2021							
25			Ausschreibung basierend auf N	1 Tag	22.06.2021	22.06.2021	19;21						
26			Mengenmodell	0 Tage	22.06.2021	22.06.2021	25						
27			Ausschreibungsmodell	1 Tag	25.06.2021	25.06.2021							
28			Ausschreibungsmodell mit Attributen erstellen	1 Tag	25.06.2021	25.06.2021	19;21						
29			Ausschreibungsmodell	0 Tage	25.06.2021	25.06.2021	28						
30			Kostenplanung	2 Tage	26.06.2021	28.06.2021							
31			Kostenmodell erstellen	1 Tag	26.06.2021	28.06.2021	19;21						
32	 		Kostenmodell	0 Tage	26.06.2021	26.06.2021							
33			Mängelmanagement	40 Tage?	03.05.2021	25.06.2021							



Projekt: msproj11 Datum: 27.06.2021	Vorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
	Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
	Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Vorgang		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Manueller Fortschritt	
	Externe Vorgänge		Manueller Sammelrollup			
	Externer Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			

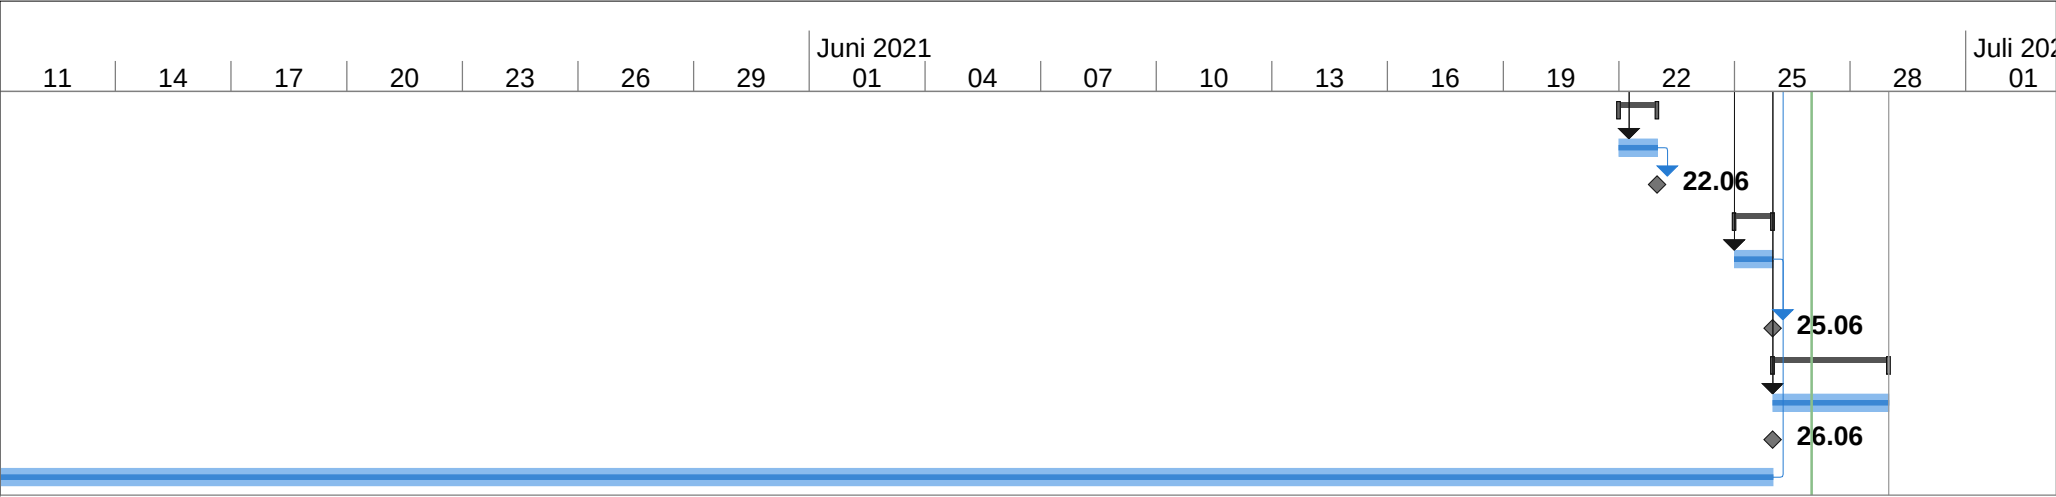

Projekt: msproj11 Datum: 27.06.2021	Vorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
	Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
	Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Vorgang		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Manueller Fortschritt	
	Externe Vorgänge		Manueller Sammelrollup			
	Externer Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			

01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

04

07

10

13

16

19

22

25

28

31	03	06	09	12	15	18	21
----	----	----	----	----	----	----	----

31

03

06

09

12

15

18

21

C

ユ

